

TREN INTERURBANO MÉXICO-TOLUCA

TRAMO CIUDAD DE MÉXICO



COMUNICACIONES

SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO




2023
AÑO DE
Francisco
VILA

EL REVOLUCIONARIO DEL PUEBLO

25 FRENTES DE OBRA TRAMO III

Longitud: 17 km

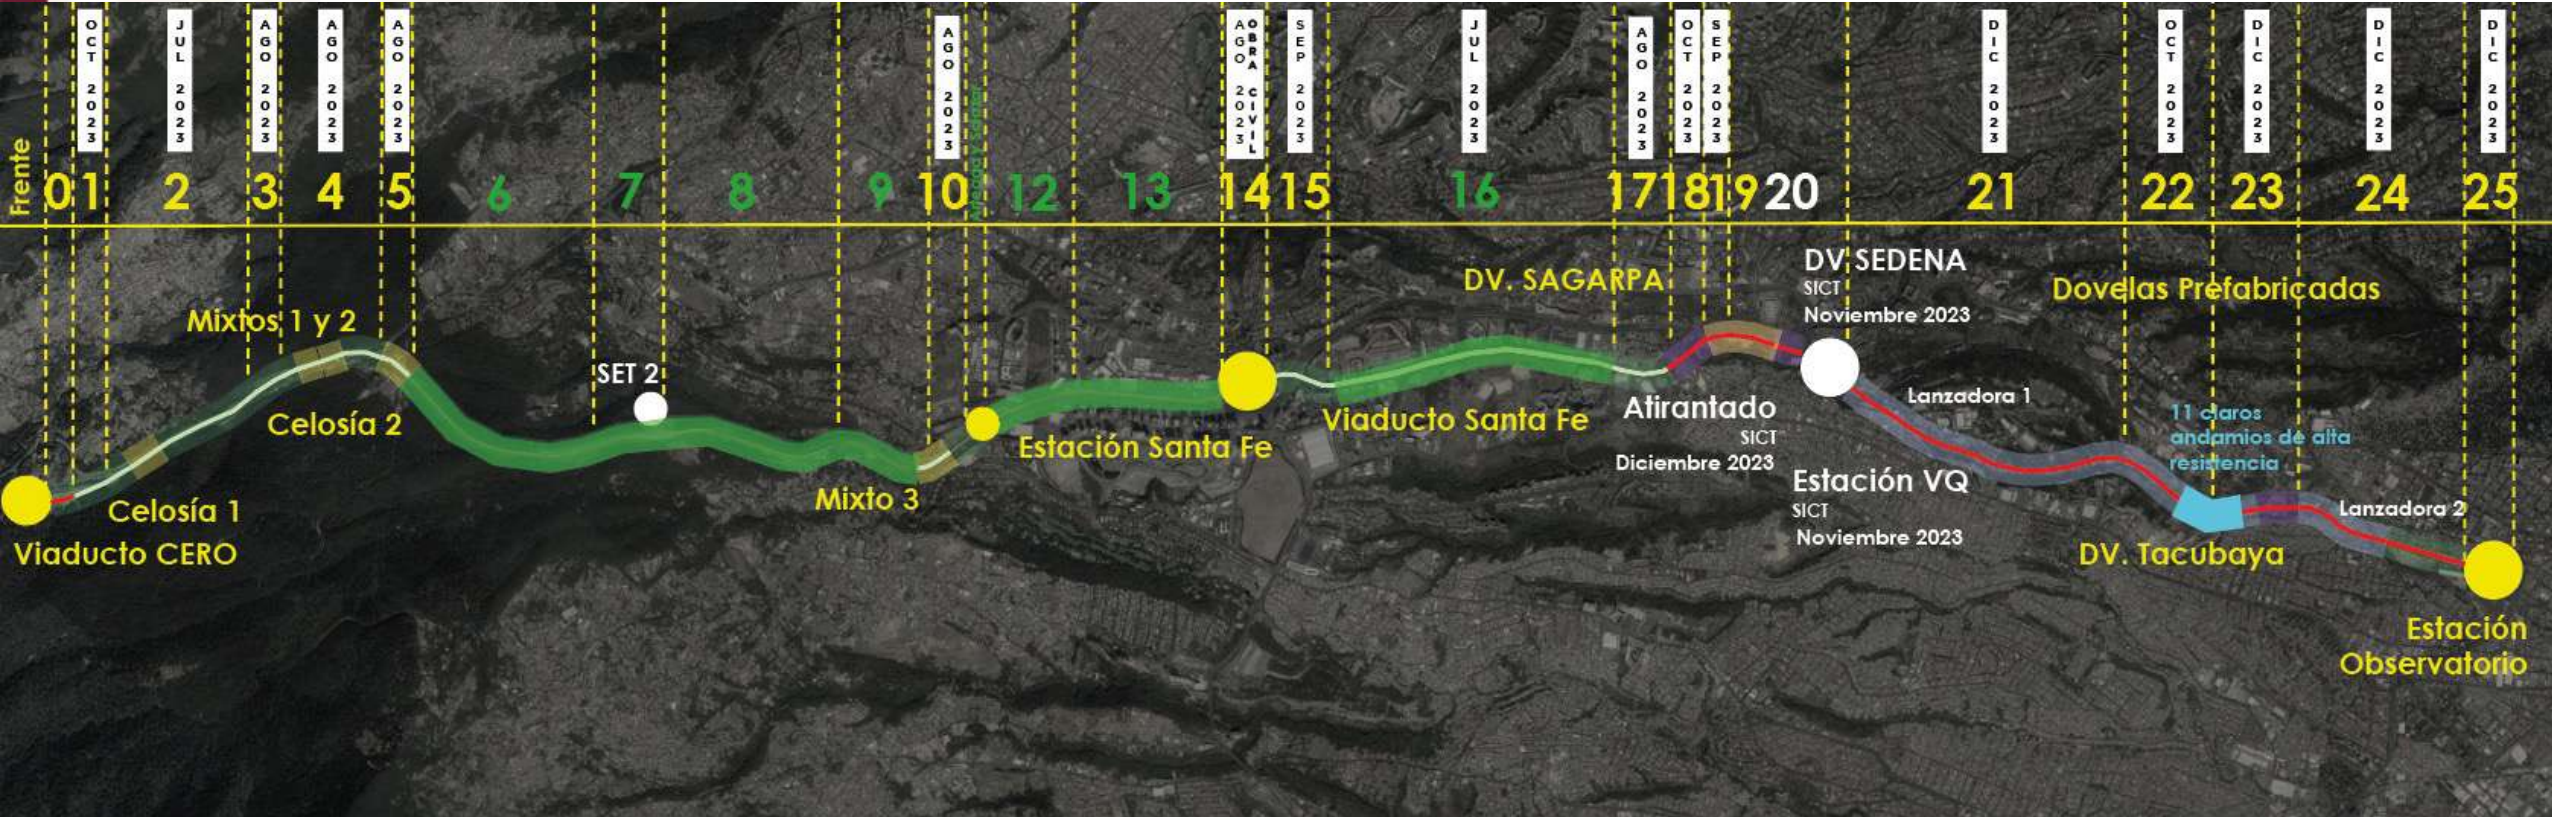

8 km entregados a la SICT
Frentes entregados 6, 7, 8, 9, 11, 12 y 13

1.6 km para entregar en este mes

Avances

Real: **77%**

Programado: **76%**

1,308 trabajadores





Celosía 1 y 2 agosto | agosto 2023



Estación Santa Fe | obra civil agosto 2023 | 220 m longitud



Doble voladizo Hondonada | octubre 2023 | 320 m longitud



Doble voladizo Presa Tacubaya | octubre 2023 | 520 m






Imagen objetivo Estación Observatorio



Viaducto Observatorio | noviembre 2023 | 162 m de longitud



Estación Observatorio | diciembre 2023 | 52% avance



ELEMENTOS ESTRUCTURALES

- **Trabes:**
Se han montado **488** de un total de **572**
- **Columnas prefabricadas:**
Se han montado **209** de un total de **228**
- **Columnas por construir en sitio:**
33 de un total de **194**
- **Dovelas:**
Se han fabricado **744** de un total de **974**
- **Estructuras metálicas:**
Avance 73.8%



Estado Mayor



Ensamble de la Secuencia 3 de la Celosía 2

TREN INTERURBANO MÉXICO-TOLUCA

TRAMO CIUDAD DE MÉXICO



COMUNICACIONES
SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO



2023
AÑO DE
Francisco
VILA

EL REVOLUCIONARIO DEL PUEBLO
